Układ graficzny © CKE 2019

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-03-22.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

Numer *PESEL* zdającego*											Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

		Numer stanowiska					

	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny	*Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił*					
Rezultat 1: Montaż pamięci i okablowania sieciowego oraz połączenie fizyczne urządzeń							
Uwaga: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.7 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu pamięci RAM1, następnie RAM2, następnie montażu okablowania. Przebieg montażu pamięci oraz okablowania należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w przebiegu 1							
1	Wykonano montaż modułu pamięci RAM1, a następnie RAM2, bez uszkodzenia modułów pamięci oraz bez uszkodzenia elementów płyty głównej						
2	Wszystkie żyły kabla podłączone są do styków dowolnego gniazda panelu krosowego wg sekwencji T568A						
3	Żyły kabla podłączone do styków panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
4	Wszystkie żyły kabla podłączone są do styków modułu Keystone wg sekwencji T568A						
5	Żyły podłączone do styków modułu Keystone nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
6	Zmontowano gniazdo sieciowe z jednym modułem Keystone						
7	Zdający przeprowadził za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo w obecności egzaminatora oraz test potwierdził poprawność jego wykonania						
8	Stacja robocza jest podłączona do 1 portu przełącznika						
9	Obie karty sieciowe serwera są podłączone do przełącznika do portów 3 oraz 4						
10	Port LAN rutera jest podłączony do 2 portu przełącznika						

		Numer stanowiska					

Rezultat 2: Diagnostyka							
Uwaga: Diagnostyka pamięci RAM powinna zostać wykonana na stacji roboczej w systemie Linux. Pliki zrzutów ekranu znajdują się w katalogach /Test_1 oraz /Test_2. Kryteria należy uznać za spełnione tylko wtedy, gdy zapisy są zgodne ze zrzutami ekranowymi. Dopuszcza się zapis N/A lub inny świadczący o braku wyświetlonej informacji, jeżeli zostało to również udokumentowane zrzutem ekranu							
1	Zapisano w katalogu /*Test_1* minimum 1 zrzut ekranu potwierdzający przeprowadzenie testów pamięci RAM1 zamontowanej w komputerze						
2	Zapisano w katalogu /*Test_2* minimum 1 zrzut ekranu potwierdzający przeprowadzenie testów pamięci RAM2 zamontowanej w komputerze						
3	Zapisano minimum dwa parametry zainstalowanej pamięci RAM1 w tabeli 1 arkusza egzaminacyjnego oraz zapisy są zgodne ze stanem faktycznym						
4	Zapisano minimum dwa parametry zainstalowanej pamięci RAM2 w tabeli 1 arkusza egzaminacyjnego oraz zapisy są zgodne ze stanem faktycznym						
Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenia sieciowe							
Uwaga: oceny kryteriów należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny konfiguracji rutera, następnie konfiguracji przełącznika							
1	Dla interfejsu LAN rutera przypisano adres 172.22.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0						
2	Na ruterze włączono serwer DHCP						
3	Ustawiono zakres dzierżawy adresów serwera DHCP na 172.22.0.5 ÷ 172.22.0.10						
4	Dla przełącznika przypisano adres 192.168.100.2						
5	W przełączniku dodano dwie nowe sieci VLAN z ID ustawionymi na 100 oraz 444						
6	Porty 1, 2 i 3 przełącznika przypisano do utworzonej sieci VLAN o ID=100 bez tagowania						
7	Port 4 przypisano w przełączniku do utworzonej sieci VLAN o ID=444 bez tagowania						

		Numer stanowiska					

Rezultat 4: Skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej							
*Uwaga: oceny rezultatów należy dokonać dla serwera w systemie Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** oraz dla stacji roboczej w systemie Linux, konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx*** *Oceny kryteriów 4.6 ÷ 4.10 należy dokonać po informacji od przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi, nadania adresu DHCP dla stacji roboczej oraz wyświetlenia witryny. Sprawdzenie komunikacji wykonuje zdający w obecności egzaminatora*							
1	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 4 przełącznika ma ustawioną nazwę IP2 oraz interfejs sieciowy podłączony do portu 3 przełącznika ma ustawioną nazwę IP1						
2	Dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3 przełącznika ustawiono adres 172.22.0.3 z maską podsieci 255.255.255.0						
3	Dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3 przełącznika ustawiono bramę domyślną na 172.22.0.1						
4	Dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 3 przełącznika ustawiono adres serwera DNS na 172.22.0.3 lub 127.0.0.1						
5	Dla interfejsu sieciowego podłączonego do portu 4 przełącznika ustawiono adres 192.168.100.1 z maską podsieci 255.255.255.0						
6	Konfiguracja interfejsu sieciowego stacji roboczej pobierana jest automatycznie, interfejs sieciowy otrzymał adres IP z zakresu 172.22.0.5 ÷ 172.22.0.10						
7	Sprawdzono komunikację między stacją roboczą a serwerem oraz urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 172.22.0.3						
8	Sprawdzono komunikację między stacja roboczą a ruterem oraz urządzenie odpowiada na polecenie np. ping 172.22.0.1						
9	Na stacji roboczej wyświetlono witrynę WWW o adresie http://172.22.0.3, zawierającą napis: "Strona testowa - egzamin INF.02"						

		Numer stanowiska					
Rezultat 5: Skonfigurowany serwer							
Uwaga: ocenie podlega konfiguracja w systemie Windows Server							
1	Utworzono folder *C:\STRONA_TESTOWA*						
2	W folderze zapisano plik o nazwie *index.html z zawartością*						
3	Na serwerze uruchomiono usługę serwera IIS i utworzono witrynę WWW o nazwie *TESTOWA*						
4	Ustawiono lokalizację witryny na utworzony przez zdającego folder						
5	Witrynę powiązano z interfejsem sieciowym o adresie 172.22.0.3						
6	Utworzono konto użytkownika **WEBMASTER** należącego do grupy użytkowników zaawansowanych						
7	Folder utworzony przez zdającego udostępniono w sieci pod nazwą *testowe_www*						
8	Dla folderu utworzonego przez zdającego skonfigurowano uprawnienia: **Administrator** – pełna kontrola, **WEBMASTER** – zapis, odczyt						
9	Dla folderu utworzonego przez zdającego skonfigurowano zabezpieczenia: **Administrator** – pełna kontrola, **WEBMASTER** – modyfikacja						
10	Na serwerze wyświetlono w przeglądarce internetowej zawartość strony WWW dostępnej pod adresem http://172.22.0.3 co udokumentowano w pliku *strona_WWW* zapisanym na pulpicie konta ***Administrator***						
Przebieg 1. Montaż pamięci RAM i okablowania sieciowego							
Zdający:							
1	podczas wykonywaniu montażu okablowania sieciowego zdejmował izolację z kabla U/UTP stosując narzędzia do tego celu przeznaczone						
2	podczas montażu kabla U/UTP do modułu Keystone i wtyku oraz podczas montowania gniazda sieciowego stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP						
3	podczas montażu pamięci RAM stosował opaskę antystatyczną oraz narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami BHP						
4	po wykonaniu montażu pamięci RAM i okablowania sieciowego uporządkował stanowisko egzaminacyjne						

Egzaminator …… .....

imię i nazwisko *data i czytelny podpis*
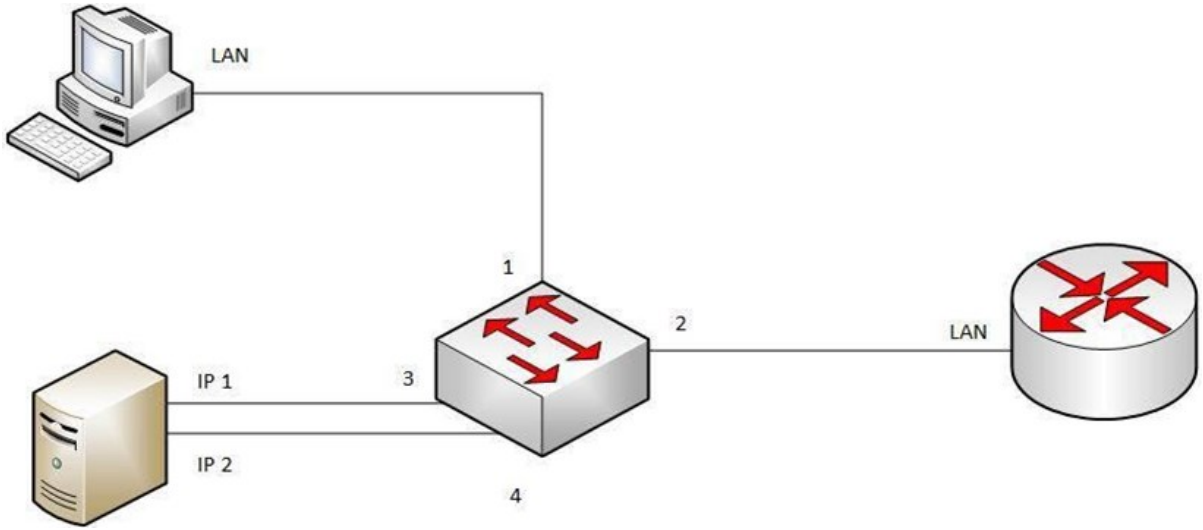
Załącznik 1: Schemat połączenia urządzeń
