Układ graficzny © CKE 2023

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

# EGZAMIN ZAWODOWY
# Rok 2024
# ZASADY OCENIANIA

***Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu***

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-03-24.01-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA 2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka ☐☐☐☐☐☐ – ☐☐☐☐☐

Kod egzaminatora ☐☐☐☐☐☐

Data egzaminu ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu ☐☐ : ☐☐

| Numer *PESEL* zdającego* | | | | | | | | | | | Numer stanowiska | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | **Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny** | *Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń** | | | | | | | |
| *UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do testu montażu okablowania. Przebieg montażu okablowania należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1* | | | | | | | |
| 1 | Wszystkie żyły kabla podłączono do panelu krosowego wg sekwencji T568B | | | | | | |
| 2 | Przewody podłączone do styków panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszcz, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm | | | | | | |
| 3 | Wtyk 8P8C zaciśnięto zgodnie z sekwencją T568B | | | | | | |
| 4 | Wtyk 8P8C zaciśnięto poprawnie - zatrzask na zewnętrznej izolacji kabla | | | | | | |
| 5 | Przeprowadzono za pomocą testera okablowania test wykonanego połączenia panel krosowy – wtyk w obecności egzaminatora oraz test potwierdził poprawność jego wykonania | | | | | | |
| 6 | Urządzenie sieciowe, stację roboczą oraz serwer podłączono zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku 1 | | | | | | |
| 7 | Panel krosowy zamontowano stabilnie w szafie lub stelażu RACK | | | | | | |
| **Rezultat 2: Diagnostyka i montaż podzespołów** | | | | | | | |
| *UWAGA: Kryterium R.2.1 należy ocenić po informacji Przewodniczącego ZN o wykonaniu montażu zapasowej pamięci RAM. Ocenie kryteriów R.2.2 ÷ R.2.7 podlega diagnostyka w systemie Windows na stacji roboczej. Testy należy porównać ze zrzutami zapisanymi w folderze TESTY na pulpicie użytkownika **Administrator** Kryteria w R.2 są spełnione, gdy zapisane parametry są zgodne ze zrzutami. Kryterium należy również uznać za spełnione, jeśli zdający zapisze "brak danych" w przypadku braku możliwości identyfikacji parametru przez system* | | | | | | | |
| 1 | Zdemontowano pamięć RAM1 oraz zamontowano zapasową pamięć RAM2 na stacji roboczej | | | | | | |
| 2 | W tabeli 1 zapisano wartość parametru Typ pamięci (Memory type) dla pamięci RAM1 i RAM2 | | | | | | |
| 3 | W tabeli 1 zapisano wartość parametru Rozmiar (Size) dla pamięci RAM1 i RAM2 | | | | | | |
| 4 | W tabeli 1 zapisano wartość parametru Maksymalna przepustowość (Max bandwidth) dla pamięci RAM1 i RAM2 | | | | | | |
| 5 | W tabeli 1 zapisano wartość parametru Producent (Manufacturer) dla pamięci RAM1 i RAM2 | | | | | | |
| 6 | W tabeli 1 zapisano wartość parametru Numer seryjny partii (Part Number) dla pamięci RAM1 i RAM2 | | | | | | |

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rezultat 3: Skonfigurowane urządzenie sieciowe** | | | | | | | |
| *UWAGA: Oceny kryteriów R.3 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do prezentacji konfiguracji przełącznika* | | | | | | | |
| 1 | Ustawiono dla przełącznika adres IP 10.10.10.1 | | | | | | |
| 2 | Utworzono VLAN o ID = 101 | | | | | | |
| 3 | Utworzono VLAN o ID = 102 | | | | | | |
| 4 | Porty 1 i 3 przełącznika przypisano do sieci VLAN o ID = 101 bez tagowania | | | | | | |
| 5 | Porty 2 i 4 przełącznika przypisano do sieci VLAN o ID = 102 bez tagowania | | | | | | |
| **Rezultat 4: Skonfigurowany serwer** | | | | | | | |
| *UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, do sprawdzenia rezultatu należy wykorzystać konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** Oceny rezultatów 4.8 ÷ 4.10 należy dokonać po zgłoszeniu od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny testu komunikacji* | | | | | | | |
| 1 | Ustawiono nazwę interfejsu sieciowego podłączonego do 1 portu przełącznika na DRUKARKA oraz interfejsu sieciowego podłączonego do 2 portu przełącznika na KOMPUTER | | | | | | |
| 2 | Dla połączenia sieciowego KOMPUTER ustawiono adres IP 10.10.10.2 z maską 255.255.255.0, serwer DNS 127.0.0.1 | | | | | | |
| 3 | Dla połączenia sieciowego DRUKARKA ustawiono adres IP 192.168.0.X z maską 255.255.255.0, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, serwer DNS 127.0.0.1 | | | | | | |
| 4 | Utworzono domenę o nazwie egzamin.local oraz w domenie utworzono jednostkę organizacyjną **Magazyn** a w niej utworzono konto użytkownika o nazwie logowania: **knowak,** imię i nazwisko: Katarzyna Nowak, chronione hasłem | | | | | | |
| 5 | Na serwerze utworzono folder C:\WSPOLNY oraz udostępniono go jako zasób sieciowy wspolny$ | | | | | | |
| 6 | Do utworzonego zasobu ustawiono uprawnienia sieciowe Wszyscy - Pełna kontrola | | | | | | |
| 7 | Do utworzonego folderu ustawiono zabezpieczenia dla **Administratorzy** - Pełna kontrola, **Użytkownicy** – Zapis oraz wyłączono dziedziczenia dla zabezpieczeń folderu | | | | | | |
| 8 | Sprawdzono komunikację serwera z drukarką za pomocą polecenia systemowego oraz uzyskano odpowiedź dla polecenia np. ping 192.168.0.200 | | | | | | |
| 9 | Sprawdzono komunikację serwera z przełącznikiem za pomocą polecenia systemowego oraz uzyskano odpowiedź dla polecenia np. ping 10.10.10.1 | | | | | | |
| 10 | Sprawdzono komunikację serwera ze stacją roboczą. Uzyskano odpowiedź dla polecenia ping 10.10.10.3 | | | | | | |

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rezultat 5: Skonfigurowana stacja robocza** | | | | | | | |
| *UWAGA: Ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, do sprawdzenia rezultatu należy wykorzystać konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx*** | | | | | | | |
| 1 | Na stacji roboczej połączenie sieciowe KOMPUTER ma ustawiony adres IP 10.10.10.3 z maską 255.255.255.0 | | | | | | |
| 2 | Na stacji roboczej połączenie sieciowe ma ustawiony adres serwera DNS na 10.10.10.2 | | | | | | |
| 3 | Zmieniono nazwę komputera na STACJA00X gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego | | | | | | |
| 4 | Zabroniono użytkownikom dostępu do edytora rejestru systemowego, co udokumentowano w pliku *rejestr.png zapisanym na pulpicie użytkownika **Administrator*** | | | | | | |

| | | Numer stanowiska | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Przebieg 1: Wykonanie okablowania sieciowego oraz montażu podzespołów** | | | | | | | |
| *Zdający:* | | | | | | | |
| 1 | zdejmował izolację z kabla U/UTP przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP | | | | | | |
| 2 | stosował narzędzia podczas montażu kabla U/UTP do panelu krosowego oraz wtyku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami BHP | | | | | | |
| 3 | wykonywał demontaż i montaż pamięci RAM z odłączonym zasilaniem jednostki centralnej, a podłączenie zasilania nastąpiło dopiero po założeniu obudowy komputera | | | | | | |
| 4 | używał opaski antystatycznej podczas montażu i demontażu pamięci RAM | | | | | | |
| 5 | zostawił uporządkowane stanowisko po zakończeniu wszystkich prac | | | | | | |

Egzaminator …….  .....

*imię i nazwisko*  *data i czytelny podpis*
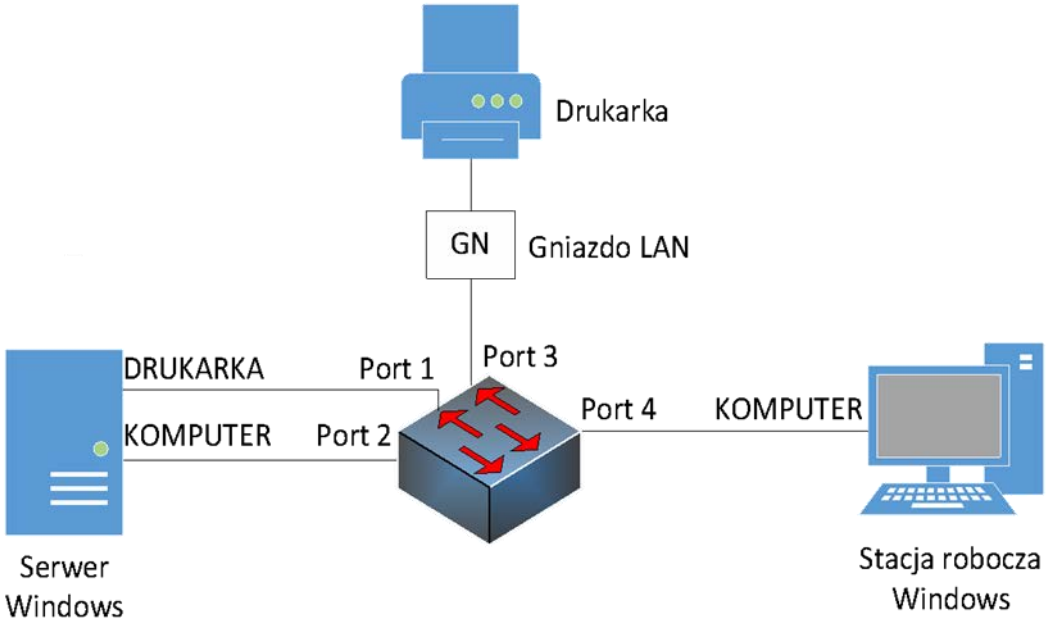
**Załącznik 1. Schemat połączenia urządzeń**
